

COMUNE DI BAONE

Piazza XXV Aprile, 1 35030 BAONE (PD)
e-mail: info@comune.baone.pd.it
posta certificata: baone.pd@cert.ip-veneto.net



PIASTRA SPORTIVA POLIVALENTE

**RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO**
ARCH. LEILA VILLANI

PROGETTO

FRANCESCO
P O L I

dorsoduro 1128 VE 30123
partita Iva n°03823740273
cell. 3356812803
francescopoli75@gmail.com

PROGETTO DEFINITIVO

Descrizione allegato

CRONOPROGRAMMA DI SPESA

N. Allegato:


DOC_10

Data:

N. ord.	Cod.	Attività	Inizio (ipotetic)	Fine	Durata gg.	Importo	Importo progressivo
1	A	Consegna dei lavori	01/03/2023	04/03/2023	3		
2	B.1	impianto di cantiere e noli	05/03/2023	09/03/2023	4	€ 500,00	
3	B.2	Rimozione	10/03/2023	16/03/2023	6	€ 2.000,00	€ 2.500,00
4	B.3	Demolizioni scavi	17/03/2023	27/03/2023	10	€ 5.000,00	€ 7.500,00
5	B.4	Scavo di sbancamento	28/03/2023	12/04/2023	15	€ 5.500,00	€ 13.000,00
6	B.5	Sottofondi	13/04/2023	28/04/2023	15	€ 12.000,00	€ 25.000,00
7	B.6	Platee in C.L.S-Opere in cemento armato	29/04/2023	24/05/2023	25	€ 10.000,00	€ 35.000,00
8	B.7	Trazioni-currugati	25/05/2023	09/06/2023	15	€ 8.000,00	€ 43.000,00
9	B.8	Posa di cordoli	10/06/2023	25/06/2023	15	€ 8.000,00	€ 51.000,00
10	B.9	Sottoservizi ed impianti	26/06/2023	08/07/2023	12	€ 5.000,00	€ 56.000,00
11	B.10	Posa in opera di plinti prefabbricati	09/07/2023	14/07/2023	5	€ 8.000,00	€ 64.000,00
12	B.12	Impianto di illuminazione	15/07/2023	26/07/2023	11	€ 25.000,00	€ 89.000,00
13	B.13	Marcia Piedili	27/07/2023	16/08/2023	20	€ 15.000,00	€ 104.000,00
14	B.14	Campo polivalente	17/08/2023	25/08/2023	8	€ 47.000,00	€ 151.000,00
15	B.15	Segnaletica indicazioni	26/08/2023	02/09/2023	7	€ 2.000,00	€ 153.000,00
16	B.16	Arredo Urbano	03/09/2023	08/09/2023	5	€ 1.000,00	€ 154.000,00
17	B.17	smobilizzo cantiere	09/09/2023	13/09/2023	4	€ 1.000,00	€ 155.000,00

Oneri sicurezza	€ 3.500,00
-----------------	------------

Inizio dei lavori	01/03/2022
-------------------	------------

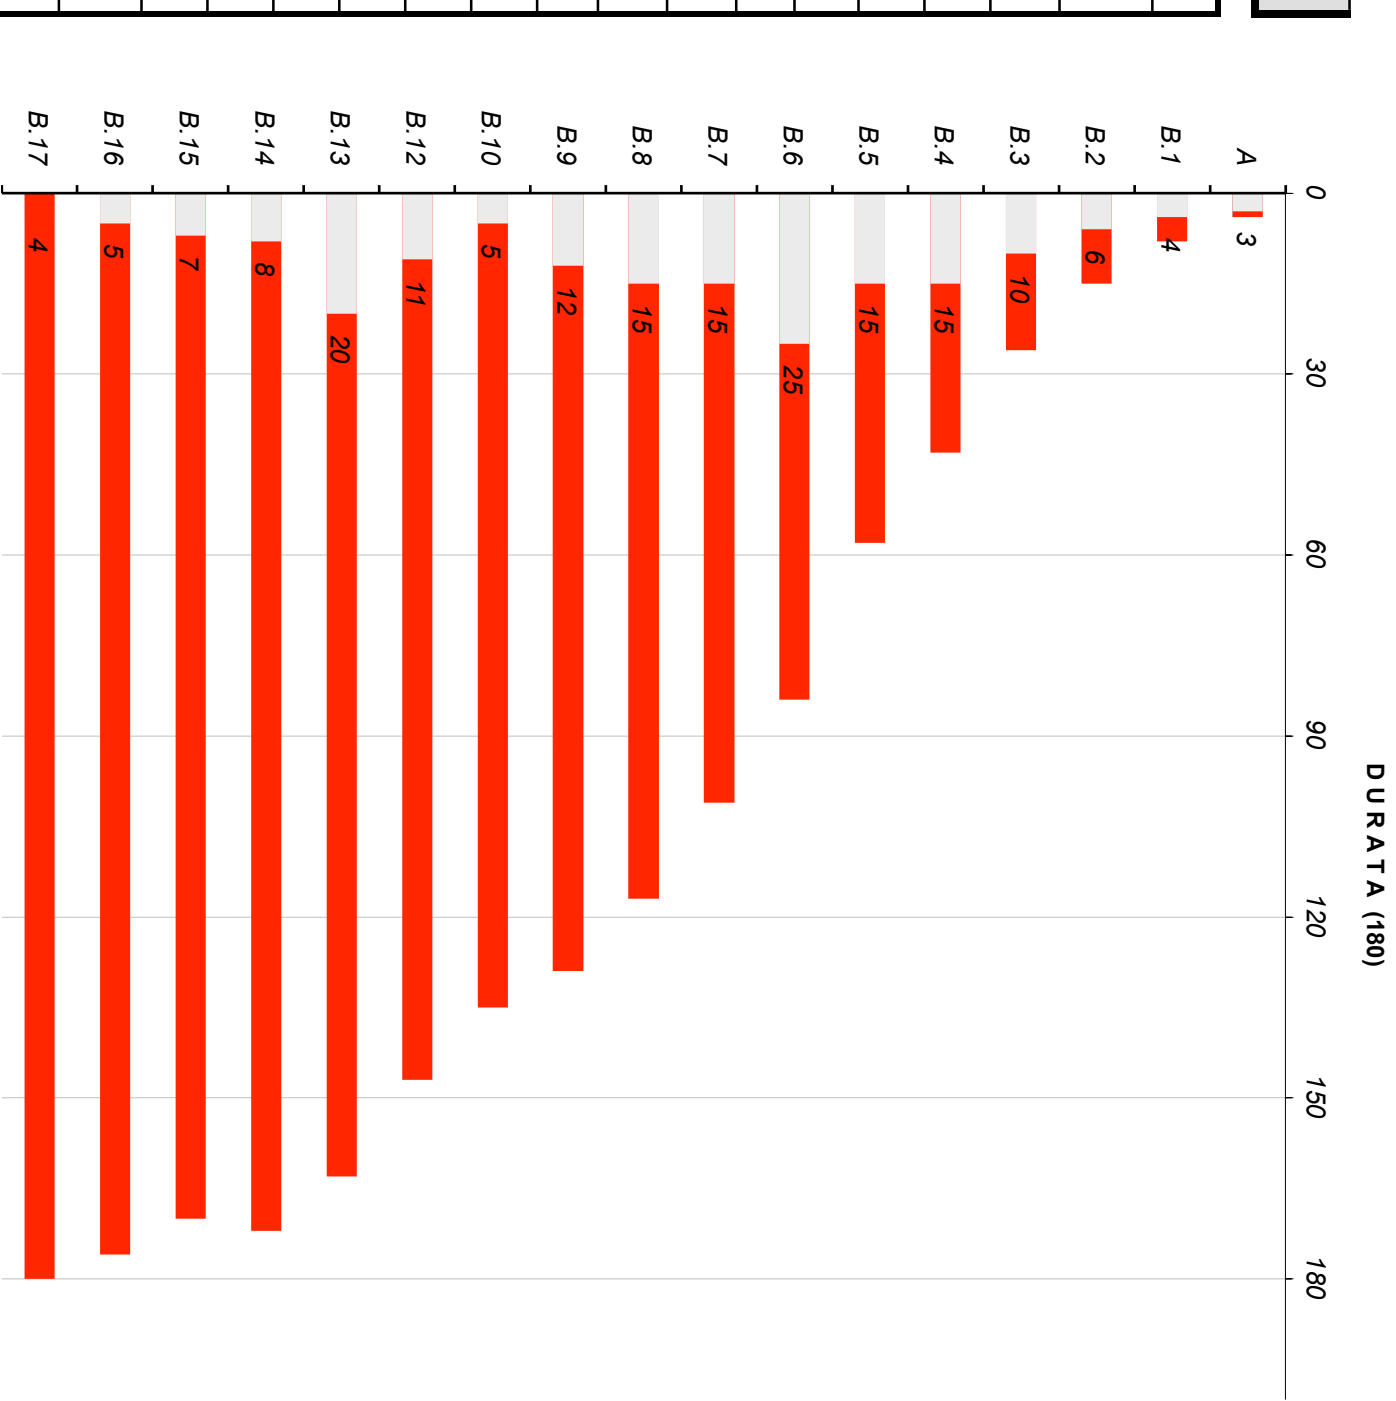

TC

180

99.

naturali consecutivi
